Infrastructure developments including the Nuclotron

Outline

Construction of new buildings

- NICA innovation center
- Collider building 17
- Second compressor building

Upgrading of plants for liquid helium and nitrogen production

Modernization of main transformer station "Dubna" (110/6 kV)



NICA innovation center designed by Project Institute "ARENA"



Suppliers of engineering equipment according to the developed project were


VBW, CUBIC, Schneider Electric, Grundfos, Saia Burgess Controls

In December 2022, the project documentation of the NICA center was received by JINR, agreed and paid for. But the force majeure conditions happened last year have become extremely difficult to pay for and deliver the engineering equipment manufactured abroad. It required to correct project documentation and placing new orders within the country of the Institute's location.



Building parameters	
Covered area, m ²	6254
Total area of the building, m ²	9997
Numbers of floors	3+basement floor
Area of the conference hall, m ²	468
Number of seats in the conference hall	268
Number of offices	100
Number of seats in the offices	357
Number of meeting rooms	3
Area of the meeting rooms, m ²	173
Area of the dining halls, m ²	140 + 43
Number of seats in the dining halls	68 + 20
Preliminary cost estimation, Billion Rub	1,9



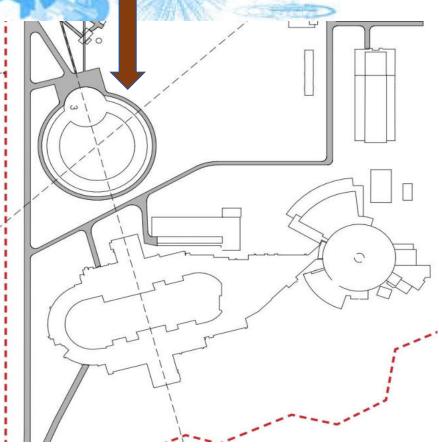

The building site has been cleared of trees; all engineering networks have been removed.
The duration of work according to the construction plan is 19 months
The construction start date after the project adjustment is the beginning of 2024.

Collider building 17 - STRABAG (General Contractor from 18/09/2015).

АО «ШТРАБАГ» Объят «Размящения тихеломонного коллайдера NICA на площадие ЛОВЗ ОКИЯ и г. Лубие с частичной роконструкцией здания №1». 141980. а/я 387. Дубна / Россия

Объединенный институт ядерных исследований 141980, г. Дубна Московской области, Ул. Жолио-Кюри, 6

Вице-директору ОИЯИ г-ну Кекелидзе В.Д. Исх.№ NICA-1-0531-23 Ответ на исх.____

Зам. главного инженера ОИЯИ г-ну Дудареву А.В.

Главному бухгалтеру г-же Кутейниковой Е.Г.

Дубна, 24.04.2023 Касательно: передачи прав и обязанностей по Договору № 100/2795 от 18.09.2015

Уважаемые господа!

На протяжении 8 лет мы совместно успешно реализуем проект «Размещение тяжелоионного коплайдера NICA на площадке ЛФВЭ ОИЯИ в г. Дубне с частичной реконструкцией здания № 1». Генподрядчик, следуя духу наших долгих партнерских отношений, обязан открыто заявлять обо всех сложностях, возникающих при реализации проекта, для совместного обсуждения возможных путей их преодоления. Такая позиция сторон доказапа свою эффективность и обозначила высокий уровень доверия между нашими организациями. В текущей геополитической ситуации Генподрядчик вынужден констатировать, что внешние и внутренние факторы, как спедствие ситуации, значительным образом поалияли на условия, в которых сейчас реализуется проект и которые требуется адатировать к создавшимся реалиям, что позволило бы сторонам, сохрание обоюдный и персональный интерес к реализации данного проекта, успешно его завершить в назначенные сроки.

На текущий момент основная часть общестроительных работ выполнена, однако выполнение работ по инженерным системам в последние месяцы значительно замедлилось вследствие объективных причин, таких как изменения в проекте, сложности в процессе закупок и поставки оборудования, материалов и т.д., о чем неоднократно Генподрядчик уведомлял Заказчика. В силу вышеописанных причин Генподрядчик не может производить и сдавать работы в таком объеме, который обеспечил бы запланированную выручку, что в итоге обозначило бы экономическую целесообразность продолжения работ на текущих условиях.

АО «ШТРАБАГ» является дочерним и подконтрольным обществом Фирмы ШТРАБАГ АГ (Республика Австрия), которая в свою очередь входит в группу компаний Концерна ШТРАБАГ СЕ (Республика Австрия). Концерн ШТРАБАГ СЕ обязан соблюдать законодательство Евросоюза, в том числе, связанное с санкционными ограничениями. Как известно, даже международная организация ОИЯИ уже столкнулась с подобными проявлениями таких ограничений при поставке уникального технополического оборудования от европейских партнеров. К сожалению, подобные действия европейских партнеров не

-UTFABAC-			Cepmorys 1 an 3
r Chiegeneges owith points, 14, op. 341 5130 Monael / Pastore www.stitutag.com	747, -7 055,545,905 8444,47,405,540,9023 245,0000469_0004	OWNER TO AN A CONTRACT OF A CO	



АD «ШТРАБАГ» Объект «Размощение тяжеломонного коллайдера NIGA на площади люВЗ ОИЯИ в г. Дубие с частичной реконструкцией здания №1». 141980. а/и 387. Дубия / Россия



всегда находятся в правовом поле и зачастую связаны с внутренними директивами компаний. Вышеуказанные законодательные санкционные ограничения, касательно политических, финансовых и других сфер взаимодействия, не могут быть преодолены АО «ШТРАБАГ» самостоятельно, и что в итоге отразиться на эффективности выполнении АО «ШТРАБАГ» своих обязательств по Договору генерального подряда № 100/2795 от 18.09.2015 г.

Потенциальные риски в любой момент могут стать неподконтрольными нам и оказаться непреодолимой преградой успешному завершению проекта. В соответствии с профессиональным управлением рисками АО ШТРАБАГ должно формально исключить дальнейщиее выполнение работ в рамках действующего договора под своим управлением.

Оценивая влияние текущей геополитической обстановки, ограничивающей деятельность Концерна ШТРАБАГ СЕ на территории РФ, учитывая высокий уровень сотрудничества и доверия между нашими организациями и осознавая повышенную степень ответственности перед международным научным сообществом в лице Заказчика-ОИЯИ, Генподрядчик просит рассмотреть возможность заключения соглашения о передаче прав и обязанностей АО «ШТРАБАГ» по Договору генерального подряда ООО «ШТРАСТРОЙ».

Общество с ограниченной ответственностью «ШТРАСТРОЙ» создано Частной компанией AZEA Limited (Республика Казахстан) 06 декабря 2022г. Допуски СРО на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос в отношении объектов капитального строительства, аключая особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства получены.

Реализуя политику социальной ответственности, желая исключить любые негативные экономические последствия, АО «ШТРАБАГ» заключила соглашение с Частной компанией AZEA Limited (Республика Казахстан) о порядке трудоустройства работников АО «ШТРАБАГ» по мере их высвобождения (в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации) в дочерние общества Частной компанией AZEA Limited (Республика Казахстан), в том числе в ООО «ШТРАСТРОЙ».

Трудоустройство высококвалифицированного персонала АО «ШТРАБАГ» в ООО «ШТРАСТРОЙ» и наличие необходимых допусков СРО на проектирование, строительство, реконструкция, в том числе на ядерных объектах, позволит ООО «ШТРАСТРОЙ» выполнить свои обязательства по Договору в полном объеме, ориентируясь на высокий уровень качества выполнения работ, используя накопленный персоналом АО «ШТРАБАГ» передовой международный опыт, технологии, стратегии и стандарты процессов строительства и управления.

Весьма значимым преимуществом является то, что компания ООО «ШТРАСТРОЙ» имеет возможность уменьшить согласованный по договору процент вознаграждения Генподрядчика, вследствие фактически более низких расходов операционной деятельности организации в целом.

В исполнение взятых ООО «Штрастрой» обязательств, STRABAG SE готов предоставить в адрес Заказчика требуемые гарантии для подстраховки соглашений или оказать поддержку ООО «ШТРАСТРОЙ» при получении банковской гарантии исполнения договора.

AEAF+ Retransministration (A log JA1 91) 11 4 Marine (Focces) Barrier (A log JA1 92) Marine (Focces) Barrier (All Second

21-22 June 2023

CHILD SEDENDUR CITIVH YESTINDOODSSEE PREVINT TROCESSES

b) Complex sequences reporting the log 2011 (25130 Monetal / Person server in stration com. N SAD WICT 5 SAD WICT AJ, CLAN IN1240 TFOD126RWE 7701/02484/9754484/005

С уважением, Генеральный директор АО «ШТРАБАГ»

AO «ШІТРАБАГ»

Объект «Размещи

предложения

141980, а/н 387, Дубна / Россия

ия тинелононного коплайдера NICA на плащадке

Коммерческие и юридические условия взаимоотношений и взаиморасчетов Сторон

Прошу Вас рассмотреть возможность заключения трехстороннего соглашения о

Мы всегда открыты к диалогу для обсуждения вышеуказанного в настоящем письме

при передаче прав и обязанностей по Договору предусмотрены в проекте Соглашения,

Приложение: проект Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору на 3 листах.

ПФВЗ ОИЯИ в г. Дубне с частичной реконструкцией здания №1».

являющегося приложением к настоящему письму.

передаче прав и обязанностей по Договору.



The General Contractor is the Austrian company. A month ago, the Institute received an official notification from the General Contractor that it will be impossible to continue the activity under the existing contract due to restrictions caused by government sanctions.

Collider building 17 - STRABAG (General Contractor from 18/09/2015).

It is expected that in the current year the rights and obligations for the work will be transferred to a company, which is not the subject for sanctions. The issue of the new General Contractor is being resolved now.

The total cost of the construction of the building is projected at 7.7 billion rubles. To date, works rate 6.2 billion rubles have been implemented, which is about 80 percent.






STATUS OF THE CIVIL CONSRUCTION WORKS

1. Earthmoving work, pile,

concrete, walls, and so on..... 100 %

- **3. Roofing work......96 %**
- 4. Metal work and fire protection......96 %
- 7. Landscaping of the construction site...81 %

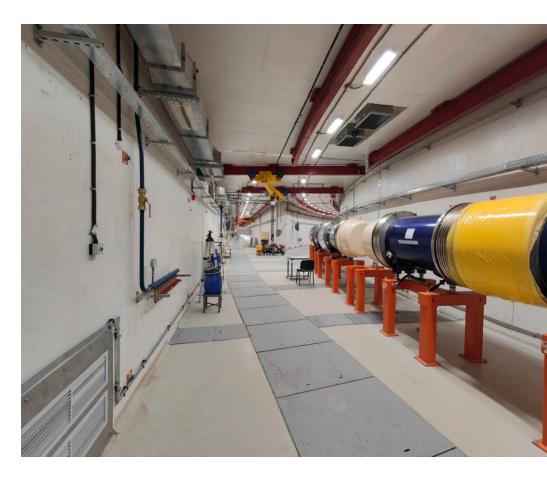



STATUS OF WORKS REQUIRING TO COMPLETE

- 2. Installation of heat supply systems, compressed air, fire-fighting water supply,

- **3. Refrigeration systems and water cooling for electrophysical**
- equipment......45 %
- 5. Automation and dispatching systems of engineering equipment......0 %

- The time of the final tests of the engineering systems expected for April-May 2024.



Equipment of the existing compressor station







21-22 June 2023

Nitrogen turbo compressor "Aerocom2-179/18"

10-14

Capacity of compressor, Nm ³ /h	10740
Inlet pressure, MPa	0.102
Inlet temperature, °C	30
Outlet pressure, MPa	1.8
Outlet temperature, °C	40
Temperature of cooling water, °C	20
Installed power of electric motor, kW	1800



New Compressor Building

State -



Helium screw compressors "Kaskad-110/30"

Capacity (Nm ³ /h)	6600
Outlet pressure (MPa)	3.0
Total power of electric motors	1600
(kW)	
Voltage (V)	6000
Number of compression stages	2
Speed (rpm)	2970
Flow rate of cooling water, m ³ /h	78

21-22 June 2023

Nitrogen turbo compressors SAMSUNG SM-5000 Nitrogen receivers





New Compressor Building





21-22 June 2023


Completion dates of the remaining works

at the new compressor station

Name of the works	Contractor	Completion dates
Commissioning of the entire facility	JINR	31.12.2023
Connection 6 kV to electric motors of compressors -	JSC EPP-T	
- without soft-start devices		- 31.07.2023
- using soft-start devices		- 30.09.2023
Water-cooling system		
- without automatic control	JSC MONTAGSPECSTROY	- 31.08.2023
- using automatic control	JSC EPP-T	- 31.10.2023
Commissioning works on compressor equipment	JSC CRYOGENMONTAG	- 30.11.2023
Completion of work on the facades	JSC STROY IST INWEST	15.06.2023
Finishing and other general construction works	JSC STROY IST INWEST	31.08.2023
Outdoor landscaping	JSC STROY IST INWEST	30.06.2023
Heating system	JSC MONTAGSPECSTROY JSC EPP-T	31.12.2023




Cryogenic Equipment of the NICA Complex

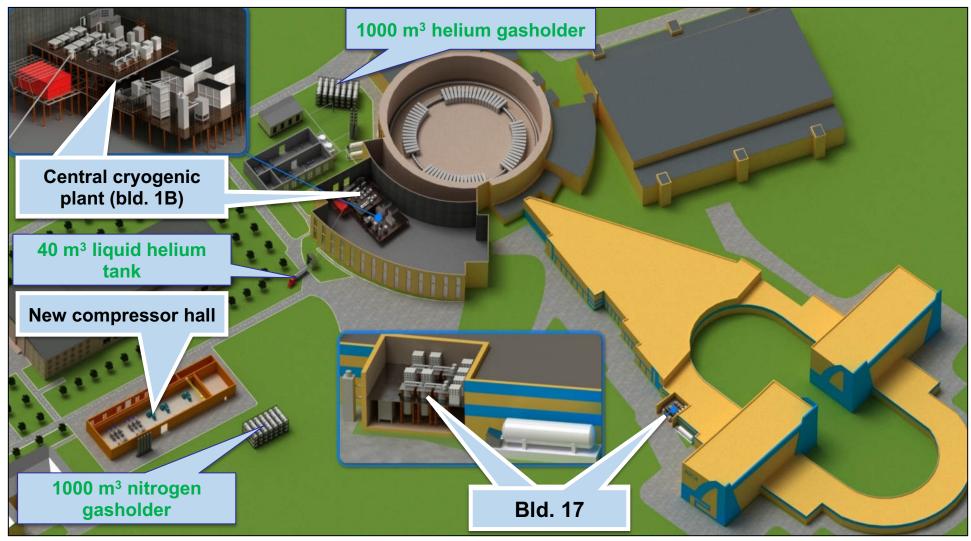



21-22 June 2023

Central Cryogenic Plant

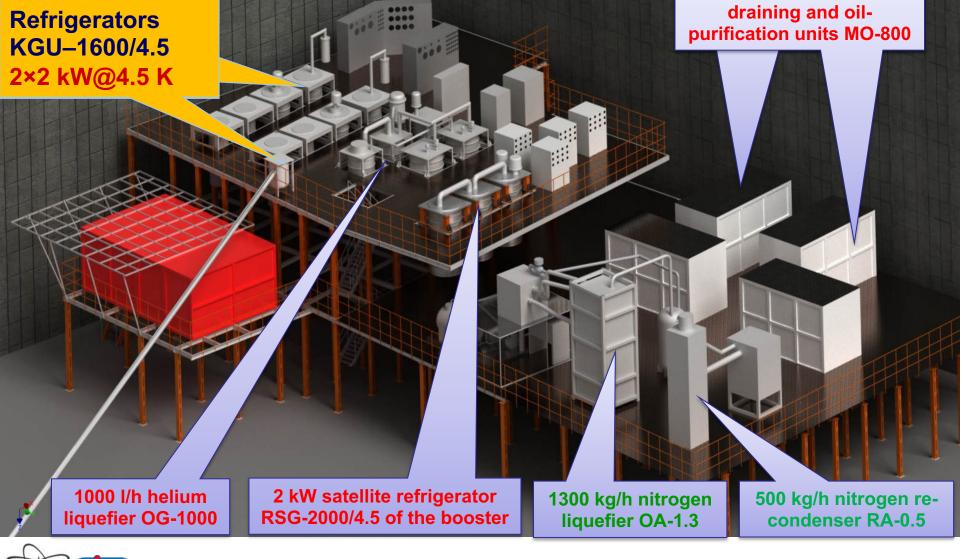


Central Cryogenic Plant







Cryogenic Plant in the collider building 17

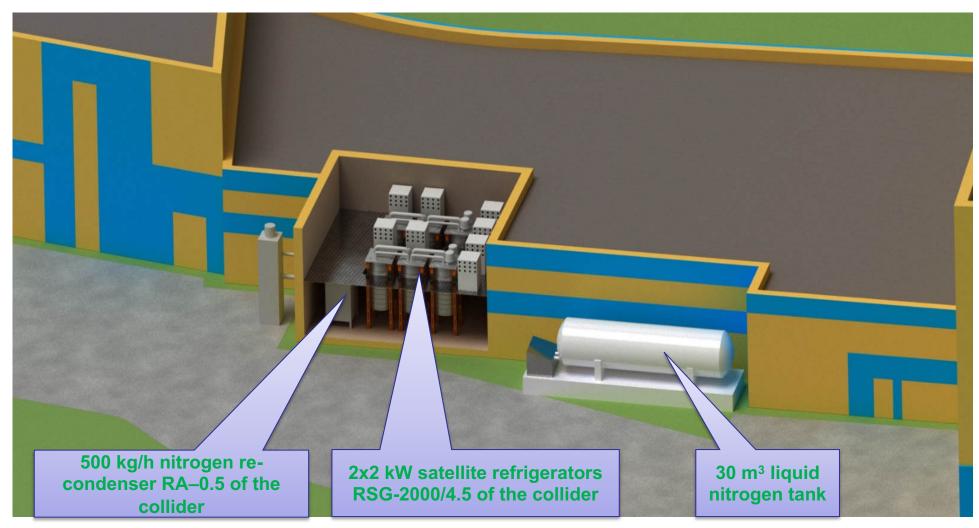



21-22 June 2023







NICA cryogenic equipment in the open air





30 m³ liquid nitrogen containers equipped with pumps







The load-bearing gallery with technological pipelines between the buildings of the new compressor and central cryogenic plant






21-22 June 2023

The load-bearing gallery for technological pipelines between the central cryogenic plant and collider building 17







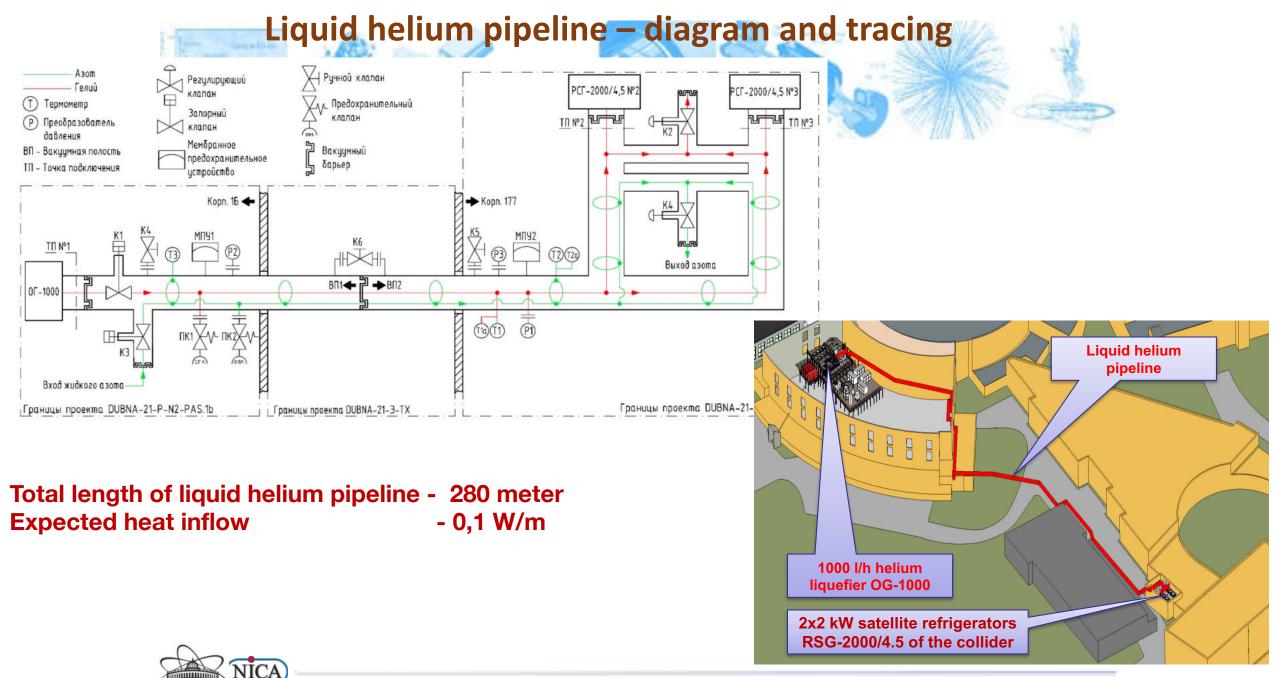

21-22 June 2023

Required electrical power for objects of NICA complex


	Consumer	Power, MW
1	Booster	1.6
2	Collider	11.0
3	New compressor hall	7.6
4	Computer cluster	1.0
5	Nuclotron	1.4
6	Channels of the bld. 205	1.6
7	Facility for assembling and cryogenic tests of the SP magnets bld. 217	1.1
8	VBLHEP infrastructure	4.4
9	East thermal station	0.8
10	NICA centre	1.8
11	Consumers in the city	8.5
	TOTAL	40.8



N.Agapov, PAC PP

Modernization of GPP1 station


The reconstruction is carried out by the subdivision of JSC Electrocentromontazh from the town of Kostroma. The deadline for completion of works in accordance with Contract No. 900-017/30 and Additional Agreements is 31.12.2023, the cost is 416 079 498 Rubles. The cost of work performed in accordance with the signed Acts is 349 424 750 Rubles (84%)

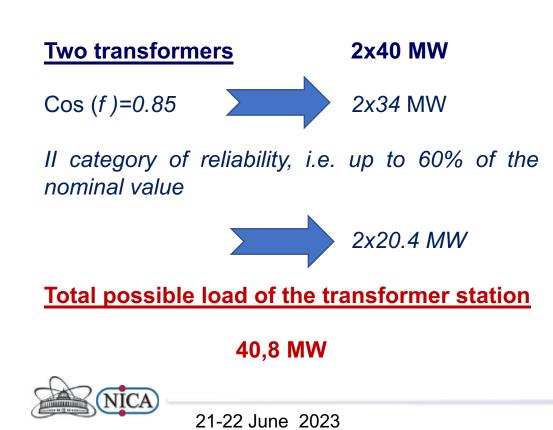

Rated power, MVA	40
Maximum rated voltage, k	V 126
Total mass with oil, t	52
Mass of oil, t	11
Shipping weight, t	45
Dimensions, m	5.5x3.5x5.0



Commissioned 6 kV distribution substations

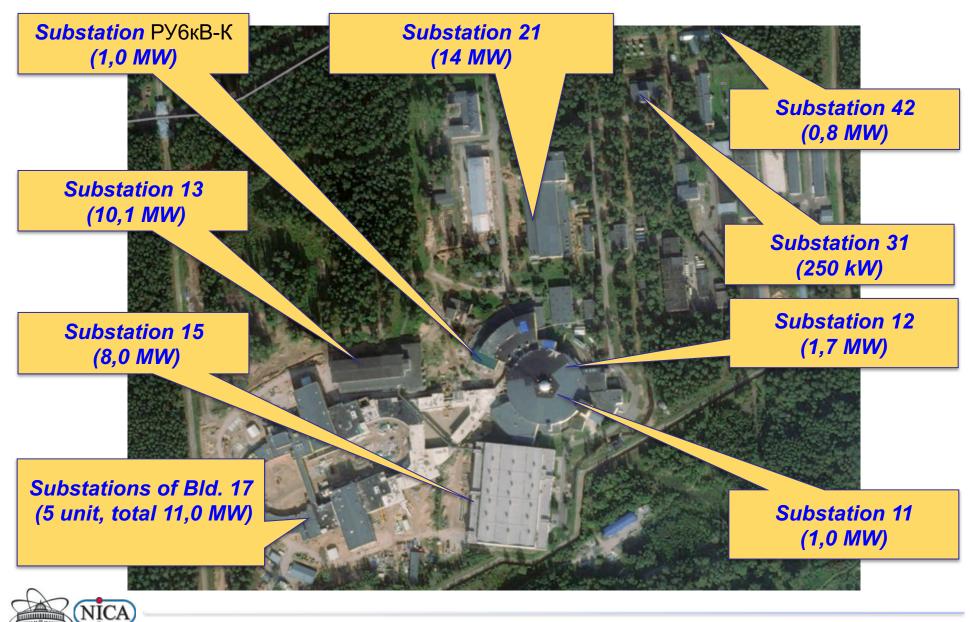

21-22 June 2023

N.Agapov, PAC PP

Thank you for your altention!

