


Статус работ по монтажу МКС


NICA Collider meeting
2024-10-23
Galimov A.R.



- 1) Завершена сборка токовых коммуникаций участка №1 (токовые коммуникации не проверены)
- 2) Завершена сборка гелиевых коммуникаций участка №1 (не проверены)
- 3) Пучковая камера участка №1 собрана и проверена на герметичность (02.10.2025)

Планы

- 1) До 6.10 провести контроль герметичности и электрические испытания
- 2) До 13.10 закрыть изоляционный объем

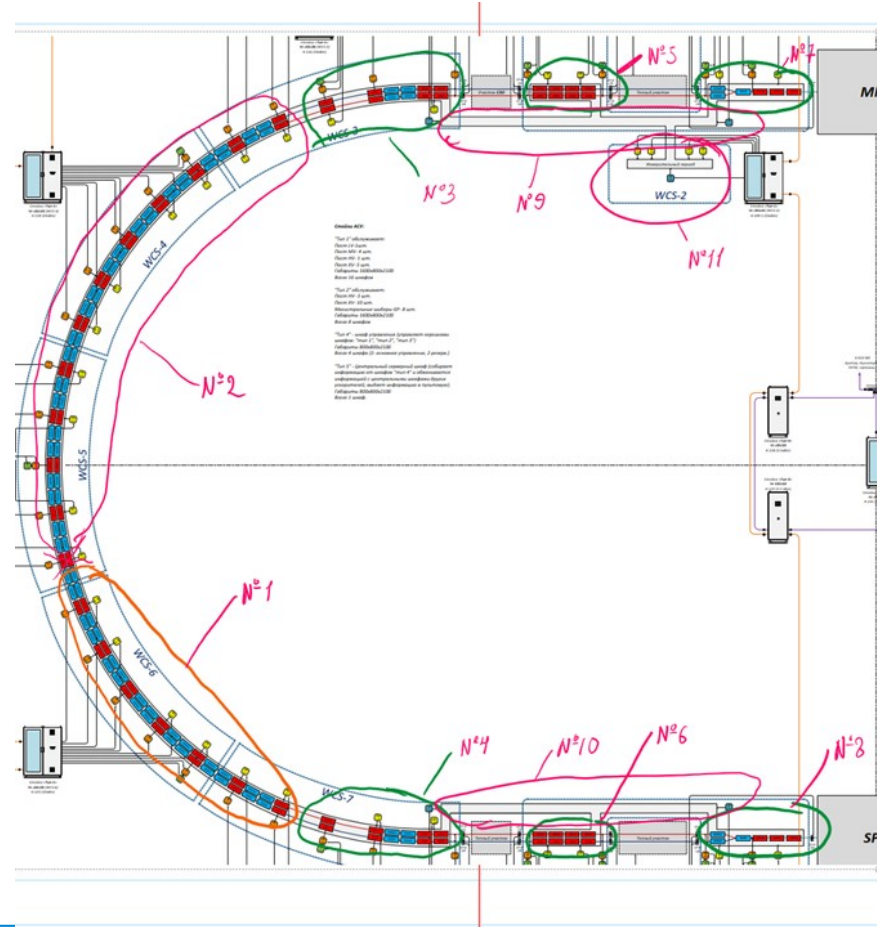

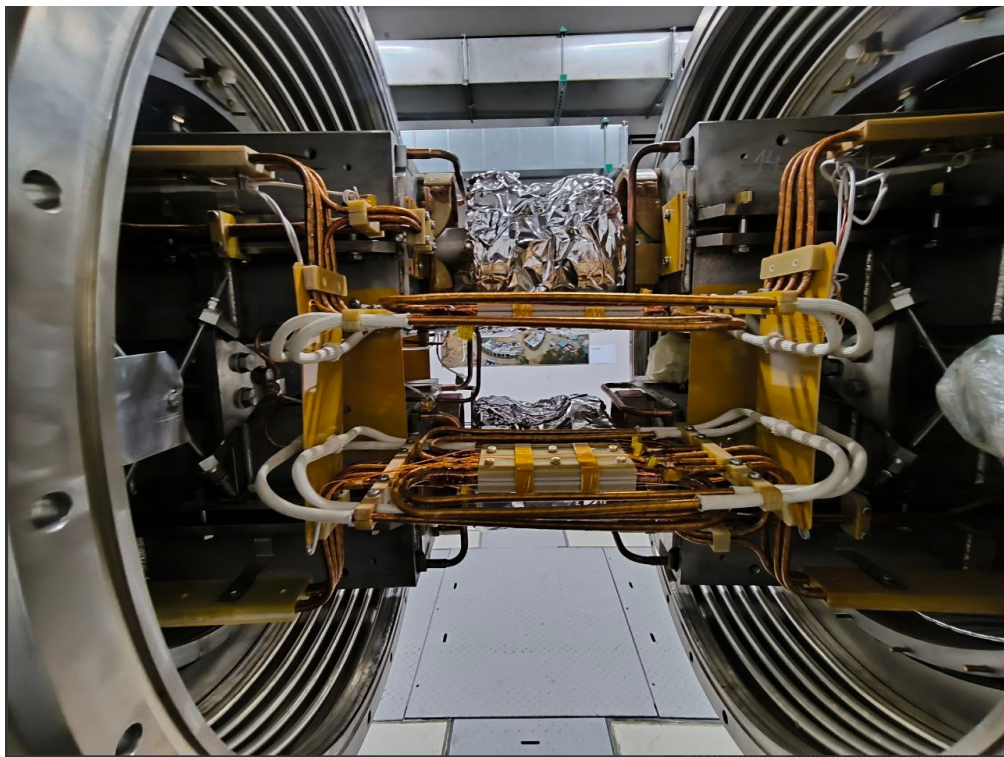

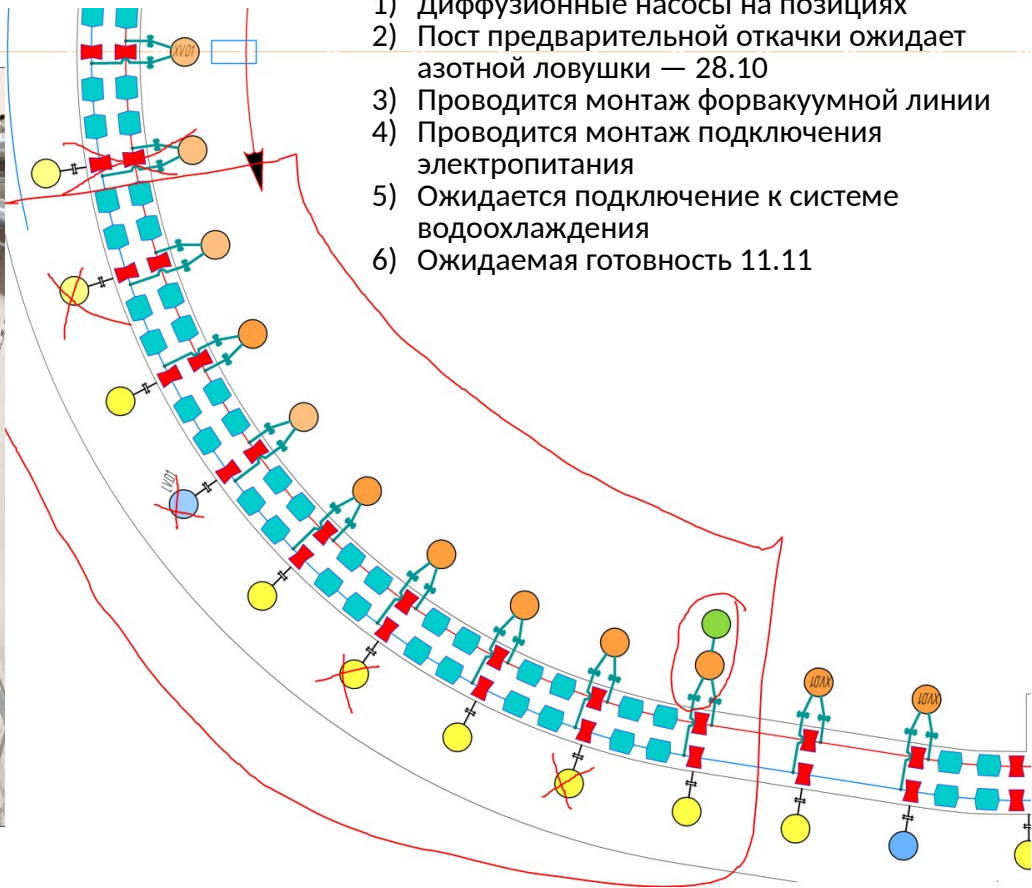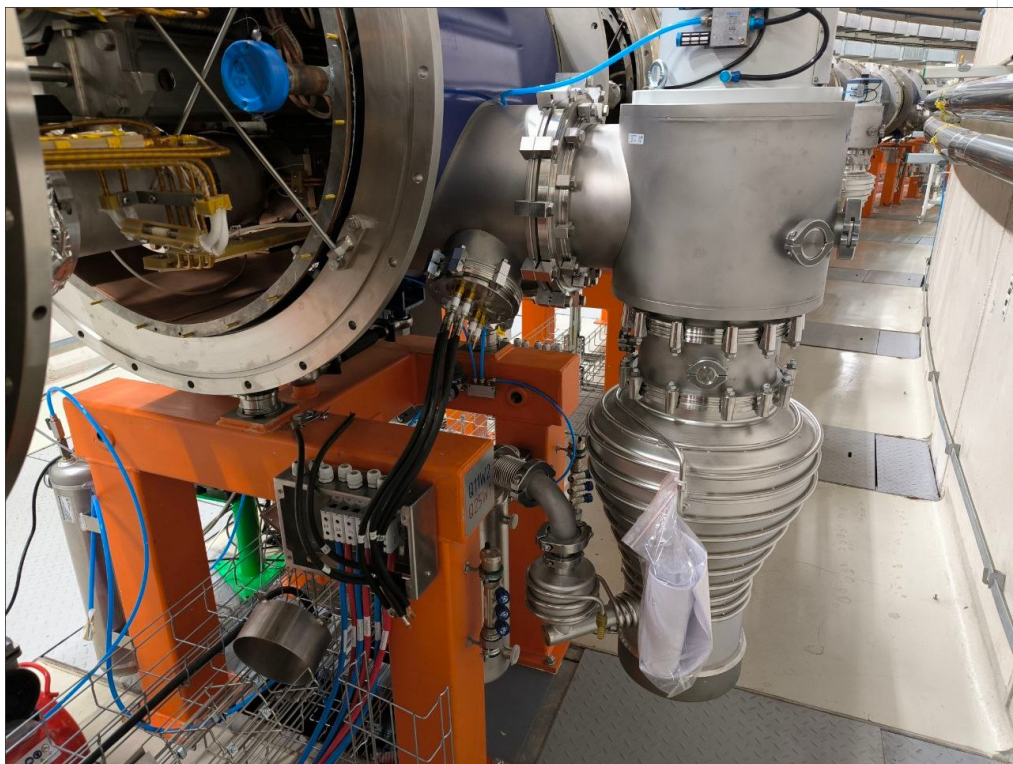

- 1) Диффузионные насосы на позициях
- 2) Пост предварительной откачки ожидает азотной ловушки — 28.10
- 3) Проводится монтаж форвакуумной линии
- 4) Проводится монтаж подключения электропитания
- 5) Ожидается подключение к системе водоохлаждения
- 6) Ожидаемая готовность 11.11





