





Установка ВМ@N. Планы на 2023 год.

Piyadin S.M.

13.09.2023



Статус работ на установке ВМ@N






В работе:

- Согласовано размещение боксов для детекторов, расположенных в вакууме;
- Составлено ТЗ на изготовление новых вакуумных боксов;
- Закрыт контракт на проектирование модернизации электроснабжения установки BM@N;
- Получена смета работ и материалов на проведении модернизации электроснабжения установки;
- Начата процедура формирования ТЗ на модернизацию электроснабжения установки;
- Завершены работы на создание чертежей механических опор для ToF400&CSC;
- 7. Частично собраны обе механические опоры;
- Завершены работы по проектированию новой конфигурации пучковой ловушки;
- 9. Весь металл для пучковой ловушки находится в 205м корпусе. Ждем расчеты для подтверждения конфигурации ловушки.

Моделирование биологической вме защиты установки ВМ@N.

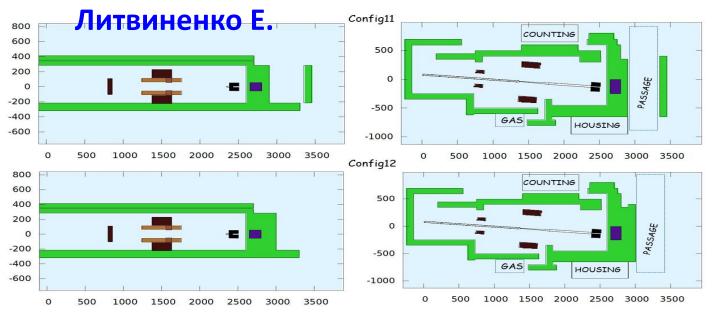


Расчеты выполненные в 2021 году

Два расчётных варианта бетонной защиты. Config11 (сверху) - вариант с воздушным проемом в бетонной защите в зоне PASSAGE, Config12 (снизу) - вариант со сплошной бетонной защитой в зоне PASSAGE. Слева показаны вертикальные разрезы (на уровне пучковой ловушки) расчетной геометрии установки. Справа показаны горизонтальные разрезы (на уровне ионопровода) расчетной геометрии установки и отмечены основные посещаемые зоны (PASSAGE — зона прохода персонала, COUNTING и HOUSING - зоны нахождения персонала во время эксперимента, GAS - зона кратковременного присутствия персонала).

Моделирование биологической вм@м




защиты установки **ВМ@N**

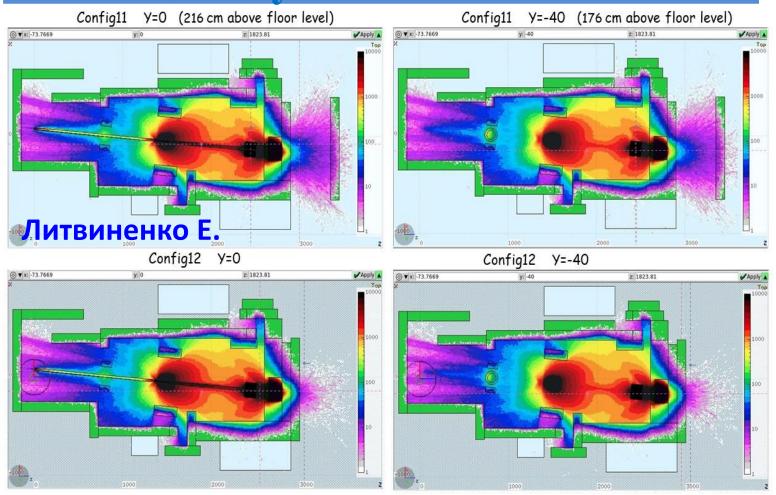

Распределения мощности эквивалентной дозы (мкЗв/час) в горизонтальной плоскости на уровне ионопровода (Y=0; слева) и на высоте 176 см от уровня пола (Y=-40; справа), рассчитанной на сетке с шагом 10 см по каждой оси координат.




Моделирование биологической вмен защиты установки ВМ@N

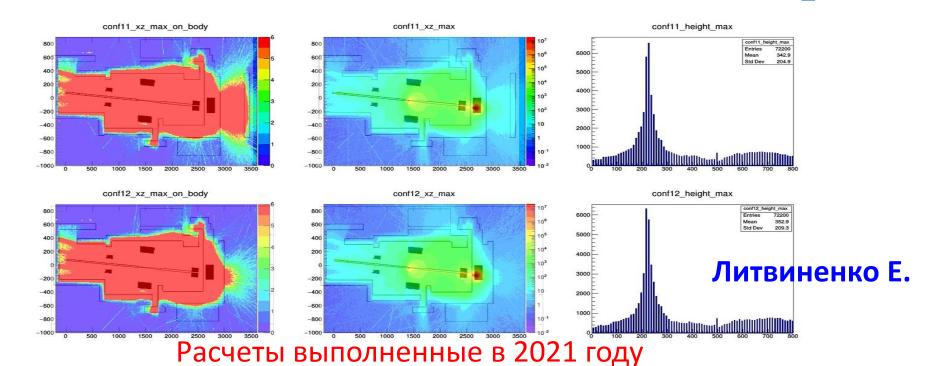

Распределения для двух вариантов бетонной защиты Config11 (сверху) и Config12 (снизу). Слева показаны распределения в горизонтальной плоскости XZ максимумов мощности эквивалентной дозы (мк3в/час), по оси Y взят диапазон 6-176 см от уровня пола, причем все значения мощности свыше 5.5 мк3в/час показаны одним цветом (красный). По центру показаны распределения в горизонтальной плоскости XZ максимумов мощности эквивалентной дозы (мк3в/час), по оси Y взят весь диапазон от -34 до 816 см от уровня пола. Справа показаны значения высоты над уровнем пола для максимумов мощности эквивалентной дозы по Y в точках сетки по X,Z.

Моделирование биологической защиты установки ВМ@N




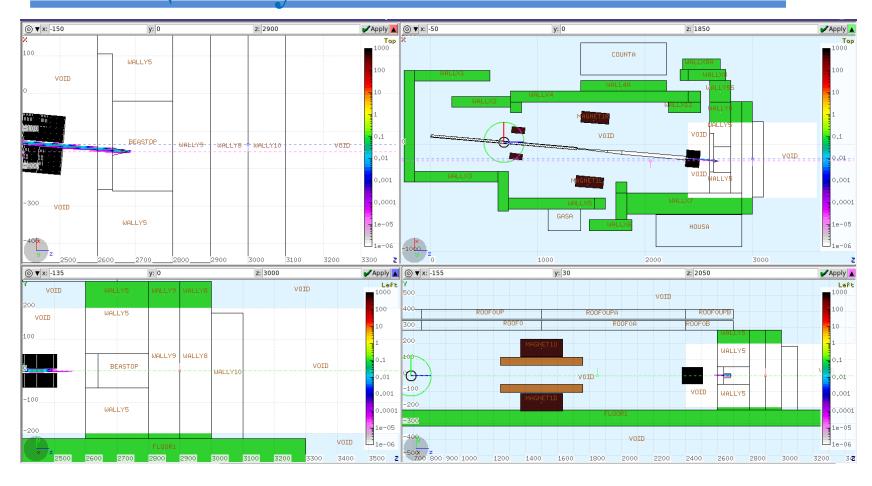

Полностью выполнена процедура создания модели элементов ионопровода и модернизированной пучковой «ловушки».

Моделирование биологической защиты установки ВМ@N




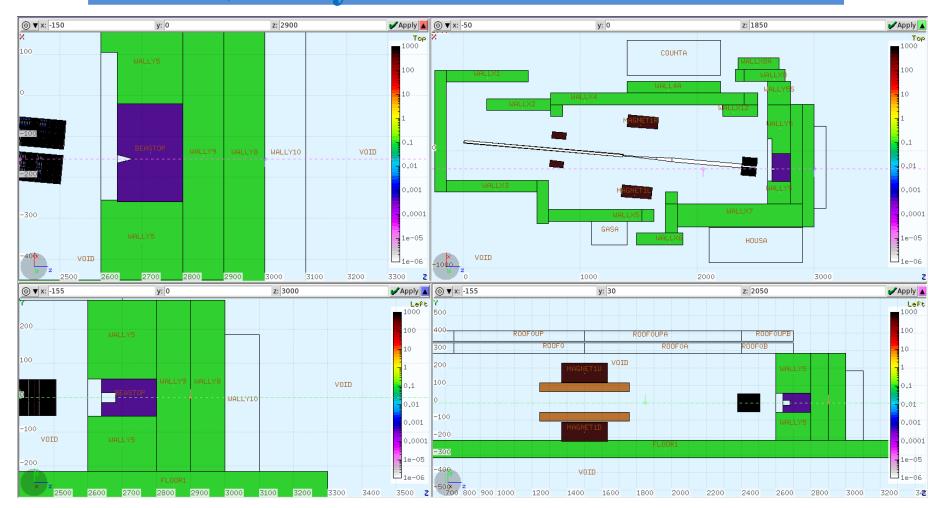

Согласованы 3 различных варианта расчета. Различия в основном затронут различные конфигурации бетонной защиты за пучковой «ловушкой».

Моделирование биологической защиты установки ВМ@N



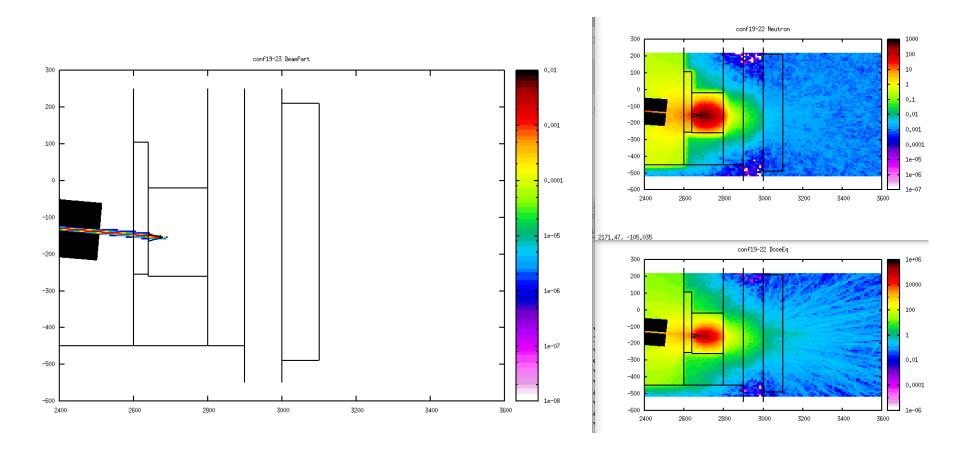

Результат запуска процесса моделирования. На картинках результат с 3000 пучковыми частицами (Au+Au)



А когда же будет сеанс в

будущем? (по состоянию на 13.09.2023)

Сеанс без ККС (криогенно-компрессорной станции) проводить бессмысленно.

ККС планируют запустить в январе 2024 года.

Сейчас все усилия направлены на сборку коллайдера.


Запуск ускорительного комплекса Бустер+Нуклотрон+Коллайдер намечен на осень 2024 года.

Но есть вероятность, что Бустер+Нуклотрон будут запускать весной 2024 года (назван месяц март •).

В связи с вышеизложенным нам необходимо собрать установку ВМ@N в полной конфигурации к марту 2024 года.



А когда же будет сеанс в будущем? (по состоянию на 26.09.2023)



В настоящий момент сеанс рассматривается (обдумывается) после весеннего паводка в 2024 году. (ориентировочно в середине мая).

Сценарий, который обсуждается:


- 1. Стартуют с охлаждения Нуклотрона + ЛУ-20.
- 2. Пока охлаждают Бустер, на Нуклотроне попробуют получить поляризованный пучок (скорее всего дейтронов). Продолжительность 2 недели. Возможна работа физиков с поляризованным пучком (DSS, AЛПОМ)
- 3. Далее работа HILAC-Бустер-Нуклотрон (прошла модернизация положения элементов канала транспортировки из Бустера в Нуклотрон).

Сеанс планируется не долгим (максимум 2 месяца), для BM@N пока есть вероятность получения пучка для проверки своего оборудования.



Доклады от детекторных групп BM@N

Докладчики от основных подсистем установки BM@N должны раскрывать следующие моменты:









THANK YOU FOR YOUR ATTENTION



